

Retrofit Sede CRA-GO

Cronograma Físico Financeiro Estimado - Valores em R\$ x 1.000

25/08/2025




item	Descrição	R\$x1.000	MESES										PICO MÊS	Prazo Meses
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Avanço Físico - Financeiro					4,55%	8,97%	17,31%	21,86%	25,26%	22,04%		25,26%	
TOTAL	Retrofit Sede CRA-GO	2.810	-	-	-	-	128	252	487	614	710	620	710	6
A	Processo Licitatório	-	-	-	Contratação								-	3
1	Arquitetura	1.652	-	-	-	5,42%	10,36%	17,78%	22,45%	24,89%	19,10%		24,89%	6
						-	90	171	294	371	411	315	411	6
1.1	TÉRREO - PLANTA - CALÇADA	899	-	-	-	8,00%	15,35%	18,50%	22,15%	19,00%	17,00%		22,15%	6
						-	72	138	166	199	171	153	199	6
1.2	SUPERIOR - PLANTA	268	-	-	-	6,60%	12,40%	17,35%	21,40%	24,68%	17,57%		24,68%	6
						-	18	33	46	57	66	47	66	6
1.3	COBERTURA	292	-	-	-	-	-	12,50%	20,00%	38,50%	29,00%		38,50%	4
								-	36	58	112	85	112	4
1.4	FACHADA	193	-	-	-	-	-	23,00%	29,00%	32,00%	16,00%		32,00%	4
								-	44	56	62	31	62	4
1	Elétrica	536	-	-	-	-	8,13%	13,90%	21,09%	27,37%	29,52%		29,52%	5
						-	-	44	75	113	147	158	158	5
1.1	TÉRREO	162					8,00%	15,35%	18,50%	22,15%	36,00%		36,00%	5
							-	13	25	30	36	58	58	5
1.2	SUPERIOR	148					6,60%	12,40%	17,35%	21,40%	42,25%		42,25%	5
							-	10	18	26	32	63	63	5
1.3	COBERTURA	18	-	-	-	-	-	-	30,00%	35,00%	35,00%		35,00%	3
									-	5	6	6	6	3
1.4	LUMINOTÉCNICO	209					10,00%	15,00%	25,00%	35,00%	15,00%		35,00%	5
							-	21	31	52	73	31	73	5
1	Hidrossanitário	177	-	-	-	-	1,75%	-	2,48%	3,42%			3,42%	4
							-	-	29	41	57	50	57	4
1.1	TÉRREO	126						18,00%	25,00%	30,00%	27,00%		30,00%	4
								-	23	31	38	34	38	4
1.2	SUPERIOR	42						15,00%	23,00%	34,00%	28,00%		34,00%	4
								-	6	10	14	12	14	4
1.3	COBERTURA	9						-	-	50,00%	50,00%		50,00%	2
										-	5	5	5	2
1	Incêndio	12	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	3
1.1	TÉRREO	8								50,00%	50,00%		50,00%	2
											4	4	4	2
1.3	SUPERIOR	4								50,00%	50,00%		50,00%	2
											2	2	2	2
1	Climatização	208	-	-	-	-	3,15%	25,00%	25,00%	25,00%			25,00%	4
							-	-	52	52	52	52	52	4
1.1	TÉRREO	166						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		25,00%	4
									42	42	42	42	42	4
1.3	SUPERIOR	42						25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		25,00%	4
									10	10	10	10	10	4
1	Administração de Obra	225				17,00%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%		17,00%	6
						-	38	37	37	37	37	37	38	6
1.1	Equipe	172				17,00%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%		17,00%	6
							29	29	29	29	29	29	29	6
1.1	Canteiro	44				17,00%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%		17,00%	6
							7	7	7	7	7	7	7	6
1.3	Ferramentas	9				17,00%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%	16,60%		17,00%	6
							2	2	2	2	2	2	2	6

Avanço Físico - Mensal	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10
Acumulado	4,55%	8,97%	17,31%	21,86%	25,26%	22,04%				
	4,55%	13,52%	30,83%	52,69%	77,96%	100,00%				

Retrofit Sede CRA-GO

Cronograma Físico Financeiro Estimado - Valores em R\$ x 1.000
25/08/2025

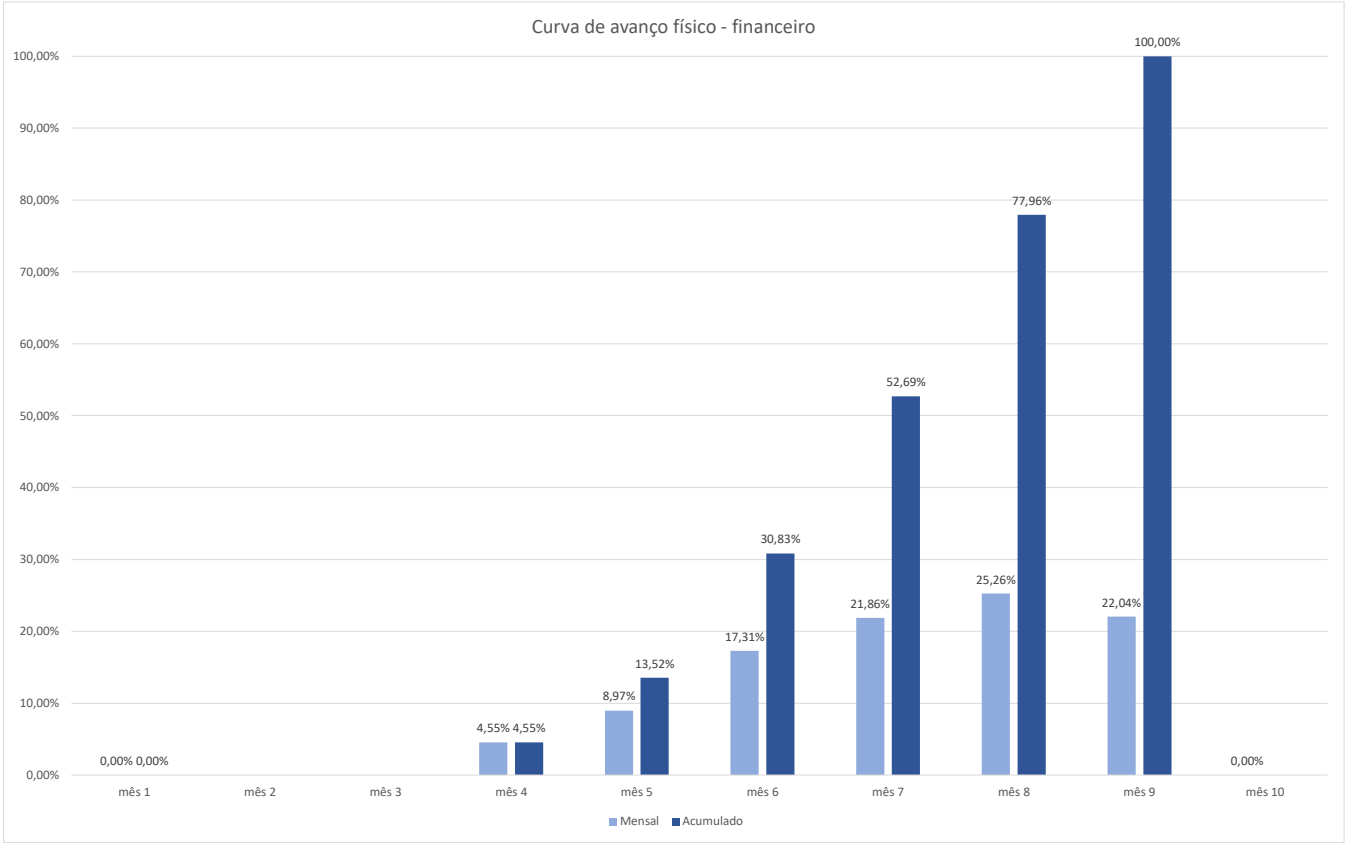

EDUARDO SOARES BORGES
CPF: 509.126.901-00
CREA-GO: 8078/D-GO
